


C.P. Julio César Vargas Gándara. Director Técnico de la Dirección General de Obras Públicas **Bitácora de obra No. OP-018-2019**. Documento de **09** hojas. Eliminado: Datos Personales. Fundamento legal: Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Artículo 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua. En virtud de considerarse información confidencial que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. Versión Pública de conformidad con el Acuerdo dictado en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del Municipio de Juárez, el 13 de noviembre de 2018.

A handwritten signature in black ink, enclosed within a hand-drawn oval. The signature is stylized and appears to read 'Julio Vargas'.

En Cd. Juárez, Chihuahua, siendo las 9:30 horas del día 22 de abril de 2019 y estando presentes en las oficinas de la Dirección General de Obras Públicas, en el Departamento de Urbanización, el Ing. Alberto Arturo Cruz Logano en su carácter de Director de Urbanización designo a Edna Guadalupe Olvera Carranza como supervisor de obra y por parte de la contratista, Urbanizadora Gricarsa, S.A de C.V., el Ing. Luis Carlos Hernández Hernández como representante legal de la empresa, designo al Ing. Fauian Arnulfo Rivera Olivas como residente de Obra de los trabajos de Pavimentación a base de concreto hidráulico de C. Sierra de la Candelaria tramo de Blvd. Oscar Flores Sánchez a Cerro de la Villanca en Col. La Cuesta en el Municipio de Juárez, Chihuahua.

Importe con IVA	\$ 3,474,257.22
Anticipo 40%	\$ 1,389,702.89
Fondo	IM/D
Fecha de Adjudicación	5 de abril de 2019
Fecha de Contrato	8 de abril de 2019
Fecha de Inicio	22 de abril de 2019
Fecha de Término	19 de agosto de 2019
Plazo de Ejecución	120 días

Continúa

... continua

Firma autorización municipio

Ing. Alberto Arturo Cruz Lozano
Director de Urbanización

Edna Guadalupe Olvera Carranza
Supervisor de Obra

Ing. Oscar Hugo Velasco Ramirez
Coordinador de Supervisores

Firma Autorización Contratista

Ing. Luis Carlos Fernandez
Representante Legal

Ing. Favian Arnulfo Rivera Olivas
Residente de Obra

Nota #1

8/Mayo/2019


Se entrega anticipo a la compañía



Nota #2

9/Mayo/2019


Se inician los trabajos con sondeos para la localización de las líneas de agua potable y drenaje.



Nota #3

10/mayo/2019


Se solicita al contratista los precios extraordinarios para el suministro y colocación de 3 cruces de línea de agua potable con todas las piezas especiales necesarias para su correcta instalación, con con 2 válvulas de " , 2 de " y una de ". Se inicia con la excavación para el suministro e instalación de la tubería de agua potable.



Nota #4

13/mayo/2019


Se inicia con el suministro y colocación de la tubería de agua potable.



Nota #5

18/mayo/2019


Se inicia con la excavación para el suministro y colocación de tubería de alcantarillado sanitario.



Nota #6

22/Mayo/2019


Se inicia con el suministro y colocación de tomas domiciliarias



Nota #7

24/Mayo/2019


Se inicia con el suministro y colocación de descargas domiciliarias



Nota #8

28/Mayo/2018/2019

Se concluye con el suministro y colocación de descargas y tomas domiciliarias.



Nota #9

29/Mayo/2019



Se inicia con el corte, carga y acarreo de material del tramo de 0+000 al 0+110.



Nota #10

5/Junio/2019



Se continua con el corte, carga y acarreo de material del tramo 0+110 a 0+219



Nota # 11

7 de junio / 19



Se inicia con el tratamiento de terracerías.



Nota # 12

14 / junio / 2019

Se inicia con el suministro y colocación de la capa sub base

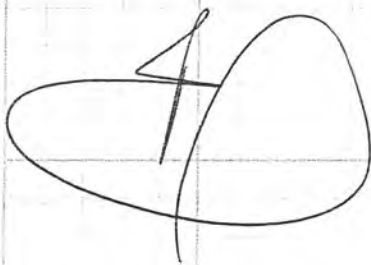

Nota # 13

18 / junio / 2019

Se inicia con la construcción de guarnición y con la alimentación para arbotante.

