


En Ciudad Juárez Chihuahua siendo las 08:00hrs del día 19 de abril de 2021 y estando presentes en las oficinas de la Dirección General de Obras Públicas; el Ing. Juan Carlos Díaz Batres en su carácter de Director de Urbanización designo a el C. Jorge Antonio Macías González como residente de obra y, por parte de el contratista GRUPO KORAACHI S.A DE C.V. el [REDACTED] como representante legal de la compañía designo a el Ing. Carlos Alberto Salinas Rodríguez como superintendente de obra para los "Trabajos de rehabilitación de pavimento, por el método de recuperación de base, carpeta asfáltica y estabilización de suelo en Calle Santos Degollado tramo Calle Francisco Sarabia a Av. 16 Septiembre, en Colonia Barrio Alto en el Municipio de Juárez Chihuahua.


Importe obra	\$ 3'557,486.03
Anticipo 40%	\$ 1'422,994.41
Fondo	FISM
Fecha inicio	19 abril 2021
Fecha termino	17 junio 2021
Plazo ejecución	60


Firma de autorización Municipio

Firma de autorización contratista


Ing. Juan Carlos Díaz Batres
Director de Urbanización

[REDACTED]
Ing. [REDACTED]
Representante legal
Superintendente de obra


C. Jorge Antonio Macías González
Residente de obra



Arq. César Hugo Velasco Ramírez
Coordinador Residentes de obra

OP-017-2021

Nota #2

19/abril/2021


Con esta fecha se dan por iniciados los trabajos del contrato OP-017-2021. Se hace entrega del inmueble al contratista.



Nota #3

23/abril/2021


OP-017-2021 contempla reparación del pavimento en un área de 6,807.83 m². Se trabajara en Calle Santos Degollado tramo: Calle Francisco Sarabia a Calle 16 Septiembre.



Nota #4

26/abril/2021


Se realiza levantamiento por parte de contratista para determinar el área contratada y además ubicar los pozos de visita, cajas de valvulas para su posterior nivelación.



Nota #5

30/abril/2021

SEGURIDAD VIAL no autoriza inicio de trabajos en Santos Degollado.





OP-017-2021

Nota #6

10/mayo/2021



Inician trabajos de rehabilitación de pavimento en Calle Santos Degollado
Se inicia con el corte de (5cm carpeta más 20 cm base)
Se trabajara el tramo de Calle Francisco Sarabia a Calle Hospital.



Nota #7

12/mayo/2021



Trabajos de mejoramiento de base hidráulica existente con material calizo
triturado t.m.a. 7 1/2" y se agregara 4% p.v.s.m. de cemento portland.
Se trabaja el tramo de Calle Francisco Sarabia a Calle Hospital.



Nota #8

14/mayo/2021


Se realizan pruebas de laboratorio para autorizar las terracerias en Calle
Santos Degollado.



Nota #9

17/mayo/2021

Se solicita a GRUPO KORAACHI perfilar todos los cruces para preparar
fendido de carpeta. Se realiza riego de protección.




OP-017-2021

Nota #10

18/mayo/2021


Previo autorización por parte de laboratorio.
Se realiza tendido de carpeta asfáltica (5cm compactos) en Calle Santos Degollado tramo Calle Francisco Sarabia a Calle Hospital.



Nota #11

20/mayo/2021



Continúan trabajos de rehabilitación en Santos Degollado.
GRUPO KORAACHI comienza con corte (5cm carpeta más 20cm base)
Se trabajara el tramo comprendido entre Calle Hospital y Calle Javier Mina. Se realiza suministro de material calizo triturado t.m.a 1 1/2"



Nota #12

21/mayo/2021



Se ~~realiza~~ ~~rehabilita~~ mejoramiento de base hidraulica existe con material calizo triturado t.m.a. 1 1/2" además de agregar 4% de su P.V. SM de cemento portland.



Nota #13

22/mayo/2021

Laboratorio realiza pruebas de compactación en tramo solicitado por contratista Calle Javier Mina a Calle Hospital.
Se inicia reconstrucción en ultimo tramo calle Javier Mina a Av. 16 Septiembre




09-017-2021

Nota #14

24/mayo/2021



Laboratorio autoriza terracerías en tramo mencionado NOTA #13.
Se inicia con tendido de carpeta 5 cm compactos con cemento
asfáltico PG 76-22, modificado con polímeros.



Nota #15

26/mayo/2021



Se realizan trabajos de terracerías en tramo Calle Javier Mina a Av. 16 Sep
Mejoramiento/tratamiento de base hidráulica existente con material
calico triturado t.m.a. 1 1/2 y agregar hasta el 4% de P.V.S.M. de
cemento portland. Previo a su homogenización y compactación se
realizan pruebas de laboratorio.



Nota #16

27/mayo/2021



Limpieza general en Calle Santos Degollado.
Se solicitan pruebas de compactación para el último tramo NOTA #15

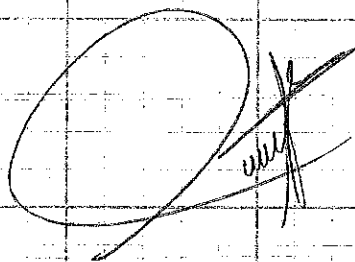

Nota #17

29/mayo/2021



Inician re nivelaciones de pozo de visita y caja de valvula.



Nota #18

31/mayo/2021


Se autoriza tendido de carpeta asfáltica en Calle Santos Degollado tramo entre las calles Javier Mina y Av. 16 Septiembre. Apoyo constante de Seguridad Vial para el cierre de calles.



Nota #18

3/junio/2021



Se realiza levantamiento de áreas para establecer el área ejecutado y presentar el Proyecto Final a la DGOP.

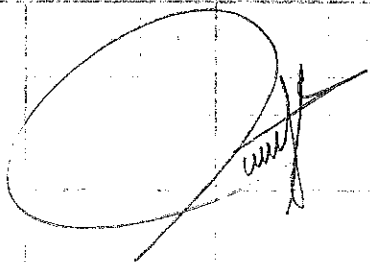

Nota #19

5/junio/2021


Trabajando en las últimas renovaciónes de pozos de visita y cajas de válvula.



Nota #20

7/junio/2021

Limpieza general para iniciar trabajos de señalización horizontal.




Op-017-2021

Nota #21

8/junio/2021


Se inician trabajos de señalización horizontal en Calle Santos Degollado. Area ejecutada 6,807.83.



Nota #22 "NOTA DE CIERRE"

10/junio/2021

Con esta fecha se dan por terminados los trabajos de rehabilitación de pavimento en Calle Santos Degollado en el tramo comprendido entre la Calle Francisco Sarabia y la Calle 16 Septiembre. Se realizó recorrido de obra con el contratista y no se encontraron detalles a corregir. La presente BITACORA DE OBRA se cierra y se inicia el proceso de cierre de la obra.



MUNICIPIO DE JUÁREZ	Fecha de clasificación	Acuerdo CT/AG/003/2018 de fecha trece de noviembre de dos mil dieciocho
	Área	Dirección General de Obras Públicas
	Identificación del documento	Documentos que contiene datos confidenciales
	Información Reservada	No aplica
	Razones que motivan la clasificación	Atención a una solicitud de acceso a la información
	Periodo de reserva	Indefinida
	Fundamento legal	Artículos 122, 128 y 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua
	Ampliación del periodo de reserva	No aplica
	Confidencial	Número de Acta de Nacimiento, Número de Credencial de Elector, Registro federal de contribuyentes, número de seguro social, número de infonavit, número de cédula profesional, número de Registro CMIC, domicilio fiscal, teléfono, correo electrónico y firma
Rúbrica del titular del Área	
